

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო

თბილისის №103 საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟი

სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების პროექტი

თბილისი 2013 წელი

სსიპ *

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო

თბილისის №103 საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟი

სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების პროექტი

პროექტის მთავარი არქიტექტორი  ზ.ნიკოლაიშვილი

სამუშაოთა წარმოების პროექტის ავტორი  ტ.სტურუა

თბილისი 2013 წელი

შემაღგენლობა

1. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
2. სამშენებლო გენგეგმა(ნახაზი „სწპ-1“) და სადემონტაჟო სქემა(ნახაზი „სწპ-2“)
3. მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალებისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანის გრაფიკი
4. მუშათა კადრების მოძრაობის გრაფიკი
5. ძირითადი სამშენებლო მანქანების მოძრაობის გრაფიკი
6. სადემონტაჟო ტექნოლოგიური სქემები
7. უსაფრთხოების ტექნიკის გადაწყვეტები
8. განმარტებითი ბარათი:
 - ა) შესავალი
 - ბ) სადემონტაჟო სამუშაოთა დახასიათება
 - გ) სადემონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობა
 - დ) სადემონტაჟო სამუშაოთა რიგობრიობა და ეტაპები
 - ე) ძირითადი სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების მეთოდები
 - ვ) საჭირო მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი

1. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-3 თვე

ფორმა №1


№	სამუშაოთა დახედება	საქონო მატერიალური მნიშვნელობა	სამუშაო დროის რაოდენობა	მუშაობის რაოდენობა	მუშაობის შედეგად მიღებული	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
							I	II	III
1	1. მოსამზადებელი სამუშაოები	3	4	5	6	7	8	9	10
1	დროებითი ღირებულების მქონე ნაგებობების მოწოდება (მონტაჟის ხანგრძლივობა)		1	2	მუშა-2	0.2			
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწოდება		1	4	მუშა-4	0.2			
3	შენობის შიდა ქსელების გაშრობვა გარე საკონსტრუქციო ქსელებთან		1	4	სამაგისტრო-2	0.2			
4	საქონის და საკონსტრუქციო მასალის დემონტაჟი, საქონის გაზრდა ქსელების დემონტაჟი	აქწვ	1	4	მუშა-4	0.2			
	II სადემონტაჟო სამუშაოები								
5	სახლის დემონტაჟი და სხვა დემონტაჟი	აქწვ	2	10	საქონი-6 მუშა-4	0.5			
6	IV სადემონტაჟო სამუშაოები	აქწვ	2	16	მუშა-6 კალა-6 მუშა-6	0.7			
7	III სადემონტაჟო სამუშაოები	აქწვ	2	16		0.7			
8	II სადემონტაჟო სამუშაოები	აქწვ	2	16		0.7			
9	I სადემონტაჟო სამუშაოები	აქწვ	2	16		0.7			
10	საინჟინერო დემონტაჟი და სამონტაჟო სამუშაოების დემონტაჟი	აქწვ	2	10	მუშა-6 მუშა-4	0.5			
11	მუშაობის განხორციელების ვალდებულების გატანა მოუდომად	აქწვ	1	4	მუშა-2 მუშა-2	1.5			
12	სამონტაჟო სამუშაოების გატანა მოუდომად	აქწვ	1	4	მუშა-4	2.0			
13	ამონტაჟი შენობის ღირებულების და მანქანის ღირებულების (მანქანისა და დემონტაჟი და სამონტაჟო სამუშაოების გატანა მოუდომად)	აქწვ	1	5	მუშა-3 მუშა-2	0.5			

პასუხისმგებელი შემსრულებელი



ტახტურა

2. სამშენებლო გენგეგმა შ 1:1000

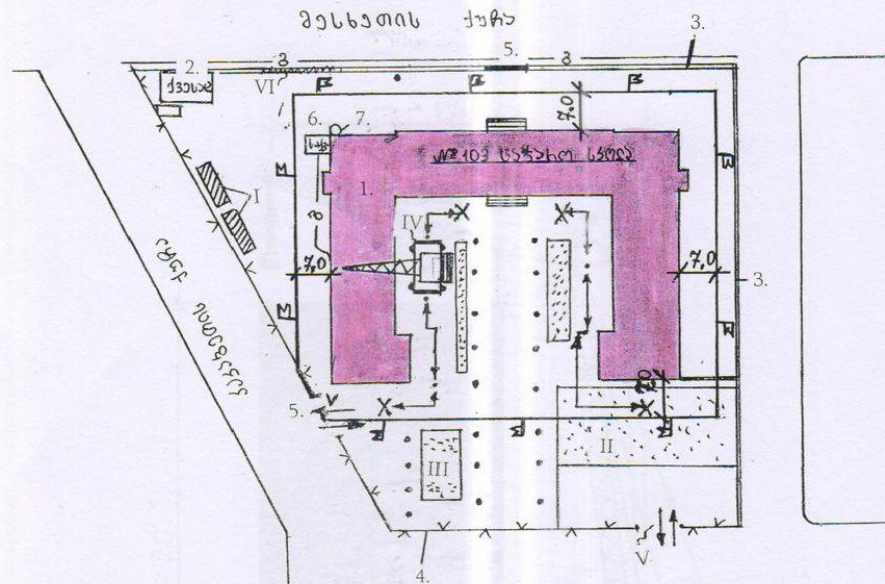

დროებითი შენობა-ნაგებობების
ექსპლიკაცია

ექსპლიკაცია

- I - დროებითი შენობები
- II - დროებითი სასაწყობო მოედანი
(მეორადი გამოყენების ვარგისი მასალების)
- III - სამშენებლო ნარჩენების სასაწყობო მოედანი
- IV - პნევმოვლიანი აშწე
- V - ტერიტორიაზე სამშენებლო ტრანსპორტის
შესასვლელი-გამოსასვლელი
- VI - დროებითი ღობე
(მონგრეული ღობის ადგილზე)

- 1. სკოლის სადემონტაჟო შენობა
- 2. არსებული სატრანსფორმატორო ქვესადგური
- 3. არსებული ბეტონის ღობე
- 4. არსებული მავთულბადის ღობე
- 5. არსებული ჭიშკარი
- 6. სადემონტაჟო საქვაბე
- 7. სადემონტაჟო საკვამლე მილი

შენიშვნა
თბილისის №103 საჯარო სკოლის
შენიშვნის დეტალი
