

5. მირითადი სამშენებლო მანქანების მოძრაობის გრაფიკი.

ფორმა №4

მ.გ.ს.პ.ა.ზ.	დასახელება	გაწმ. ერთ.	მანქანების რაოდენობა	მანქანების საშუალოდღეადამური რიცხოვნობა თვეები		
				I	II	III
1	2	3	4	5	6	7
1	მშენებლო-მშენებელი ავტო ტვირთმანქანით 25 ტნ	ცალი	2			
2	ექსკავატორი "უკრაინა"-1მ-იანი	ცალი	2			
3	ემბიანი ექსკავატორი "კოდლა"	ცალი	1			
4	ბულოდინგერი	ცალი	1			
5	ავტოთვიმცდელეები	ცალი	8			
6	ბორტული ავტომანქანა	ცალი	4			
7	საკეილორბეული ტრანსპორტი	ცალი	2			
				7	14	10

პასუხისმგებელი შემსრულებელი  გამაზიდაური

6. ტექნოლოგიური სქემები

ა) ტექნოლოგიური სქემა №1

გადახურვის ანაკრები ფილების დემონტაჟი

პირობითი აღნიშვნები:



-შენობის კონტური



-სადემონტაჟო გადახურვის ანაკრები ფილა



-სადემონტაჟო ხვრელები




-ბაგირჩამჭიდები



-სადემონტაჟო ტრავერსი

მოთხოვნები:

1. პნევმოთვლიანი აწე
ტვირთამწ. 25ტნ -1ც
2. კომპრესორი-1ც
3. პერფორატორი-1ც
4. ტრავერსი-1ც
5. ბაგირჩამჭიდები-4ც
6. მემონტაჟე-2კაცი
7. დამხმარე მუშა-2კაცი

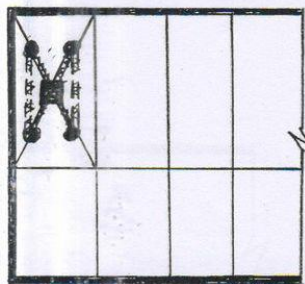

სამუშაოთა წარმოების მეთოდები:

1. გადახურვის ფილების დემონტაჟის დაწყებამდე მოხდეს მათი ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება, წონისა და სადემონტაჟო პარამეტრების დაზუსტება.
2. სადემონტაჟო ოპერაციები:
 - ფილის მომზადება დემონტაჟისთვის
 - ფილის ჩაბმა ბაგირჩამჭიდებით ტრავერსზე და აწეზე
 - ბაგირჩამჭიდების მსუბუქი დაჭიმვა და ფილის დაქერა ჭიმებით
 - არმატურის კარკასის გაშიშვლება და ჩაჭრა

- ფილის საკონტროლო და ძირითადი აწევა
- ფილის გამოტანა კონტურიდან თავისუფალ სივრცეში
- ფილის დაშვება დასაწყობების ადგილზე
- ბაგირჩამჭიდების ჩახსნა ფილაზე

ბ) ტექნოლოგიური სქემა №2

აგურის კედლების და ტიხრების გამსხვილებული ბლოკებით დემონტაჟი

პირობითი აღნიშვნები:



-შენობის კონტური



-სადემონტაჟო აგურის კედლის გამსხვილებული ბლოკი



-ბაგირჩამჭიდები




-სადემონტაჟო ტრავერსი



-სადემონტაჟო კოჭები

მოთხოვნები:

1. პნევმოთელიანი ამწე-1ც
2. კომპრესორი-1ც
3. პერფორატორი-1ც
4. ტრავერსი-1ც
5. ბაგირჩამჭიდები-2ც
6. სადემონტაჟო კოჭები-4ცალი
7. კალატოზი-1კაცი
8. დამხმარე მუშა-2კაცი



სამუშაოთა წარმოების მეთოდები:

1. გამსხვილებული ბლოკებით აგურის კედლების და ტიხრების დემონტაჟის დაწყებამდე შემოწმდეს მათი ტექნიკური მდგომარეობა
2. სადემონტაჟო ოპერაციებია:
 - ბლოკების მომზადება დემონტაჟისთვის

- ბლოკის ჩაბმა ბაგირჩამჭიდებით ტრავერსზე და ამწეზე
- ბაგირჩამჭიდების მსუბუქი დაჭიმვა და ბლოკის დაჭერა ჭიმებით
- ბლოკის მთლიანი დაშორიშორება დანარჩენი კედლისგან
- ბლოკის საკონტროლო და ძირითადი აწევა
- ბლოკის გამოტანა შენობის კონტურიდან თავისუფალ სივრცეში
- ბლოკის დაშვება დასაწყობების ადგილზე
- ბაგირჩამჭიდების ჩახსნა ბლოკზე

7. უსაფრთხოების ტექნიკის გადაწყვეტები

ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნდაწ - III-4-80* - „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“-ის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შენობის შიგა კომუნიკაციები(დენი, წყალი, კანალიზაცია, გაზი და სხვა) უნდა გამოირთოს გარე ქსელებიდან.

ანაკრები რკ/ბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟის დაწყებამდე აუცილებლად უნდა დაზუსტდეს მათი წონები, განლაგება და ტექნიკური მდგომარეობა.

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებლად უნდა შემოიღობოს სახიფათო ზონები, აღინიშნოს ეს ზონები კარგად დასანახი ამკრძალავი და გამაფრთხილებელი ნიშნებით და სასიგნალო ნათურებით.

ამასთანავე, დროებით უნდა შემოიღობოს არსებული ბეტონის ღობის დანგრეული ნაწილი მესხეთის ქუჩაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული უცხო ადამიანთა მოხვედრა სკოლის ეზოში სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების დროს.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას აკრძალულია უცხო ადამიანთა ყოფნა სკოლის ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით კი დემონტაჟის სახიფათო ზონებში.

ყველა მუშა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი სამუშაოთა წარმოებისას აღჭურვილი უნდა იყოს ინდივიდუალური უსაფრთხოების კომპლექტით(უსაფრთხოების ქამრები, რეზინის ფეხსაცმელი და ხელთათმანები, ჩაფხუტები და სხვა). აკრძალულია სადემონტაჟო
