

შენიშვნები:

1. წინამდებარე ნახაზი „სწვ-1“ ძილეთ განმარტებით ბარათთან და ნახაზ „სწვ-2“-თან ერთად.
2. წინამდებარე სამშენებლო გენგეგმა დამუშავებულია შენობის მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის პერიოდისათვის.
3. სადემონტაჟო სამუშაოები ხორციელდება მოძრავი პნევმოთვლიანი ამწის საშუალებით, ტვირთამწეობით 25ტნ. ამწე მუშაობს როგორც ისრულ, ასევე ისრულ-ბატიყელიან შესრულებაში.
4. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებით ბარათში.
5. ყველა სადემონტაჟო სამუშაო შესრულდეს სნდაწ - III-4-80* - „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“-ს მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.

პირობითი აღნიშვნები:



-სკოლის სადემონტაჟო შენობა



-არსებული ბეტონის ღობე



-არსებული მავთულბადის ღობე



-პნევმოთვლიანი ამწე



-ამწის მუშა სვლის ღერძი



-ამწის კიდურა დგომი



-არსებული საკვამლე მილი



-საქვების არსებული გაზსადენი



-დროებითი შენობა-ნაგებობა



-ღია სასაწყობო მოედნები




-არსებული ხეები



-სახიფათო ზონის საზღვარი
სადემონტაჟო სამუშაოების
წარმოებისას

სსიპ საბუნებრივ რესურსთა დაცვის სამსახური ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური მ. ალექსიძის ქ. თბილისი-საბურთალოს რაიონი საბურთალოს რაიონი 2006 ტელ: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.mepa.ge	ნახაზის დასახელება სამშენებლო გენგეგმა ნახაზის ნომერი ტექნიკური დოკუმენტაცია სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების პროექტი	პ. მ. არაბაძის საბუნებრივ რესურსთა დაცვის სამსახური გეგმვის დონე შეამოწმა ტარიელ ხუფრუა მასშტაბი 1:1000 ნახაზი „სწვ-1“ ფურც. N1 სულ ფურც. 2	სტადია მ. ალექსიძის ქ. თბილისი-საბურთალოს რაიონი
---	---	---	--

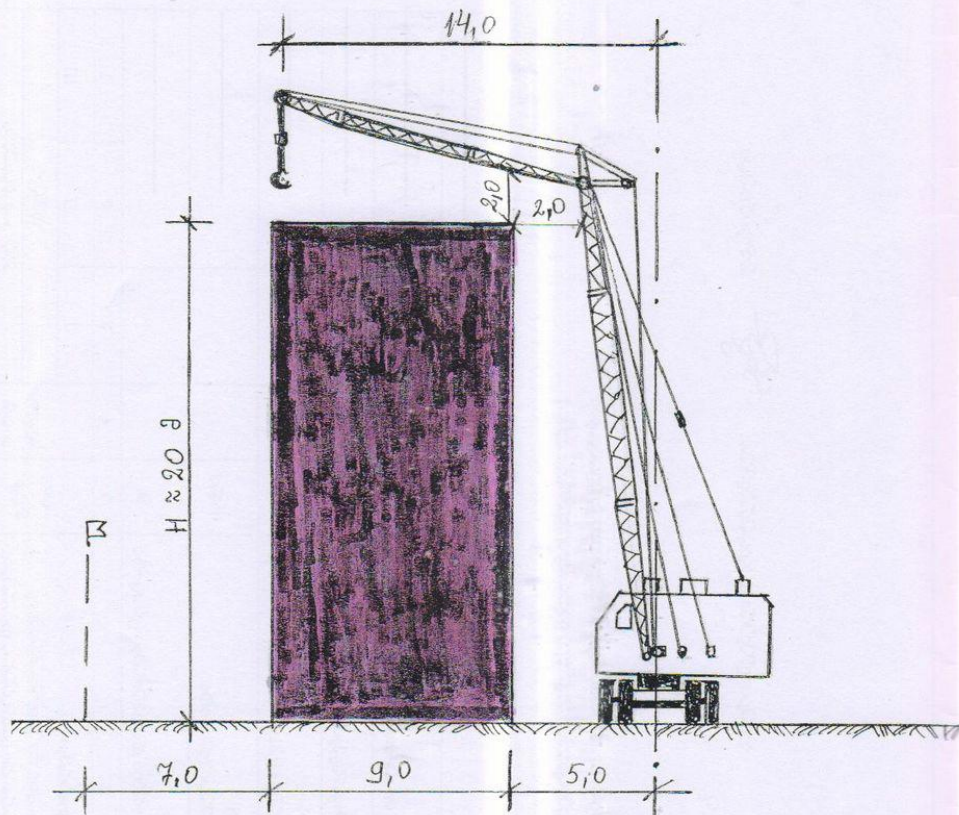

შენიშვნა

თბილისის №103 საჯარო სკოლის
შენიშვნის დამატება

3. მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალებისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანის გრაფიკი

ფორმა №2

№	დემონტირებული, დამოღობი და მიწგრებული მასალების, ნაკეთობების, დეტალების და კონსტრუქციების დასახელება	გაწმ. ერთ.	რაოდ. ქოზა	გატანის გრაფიკი		
				I	II	III
1	2	3	4	5	6	7
1	სახურავის და სხვენის მასალები და დეტალები (მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი)	მკ	-			
2	კედლების და ტიხრების აგური (მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი)	ცალი	-			
3	ანაკრები დრუტანაში ფილები (მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი)	ცალი	-			
4	კარი-ფანჯრები (მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი)	ცალი	-			
5	ლითონის საკვამლე მძილი და ლითონის სხვა კონსტრუქციები	ტნ	-			
6	სამშენებლო ნარჩენები	ტნ	-			

შენიშვნა: მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების მოცულობები განისაზღვრის უშუალოდ ადგილზე, სამუშაოთა წარმოებისას.

პასუხისმგებელი შექმნულბეული:



ფ. გაბიდაური

4.მუშათა კადრების მოძრაობის გრაფიკი

ფორმა №3

№	მუშათა პროფესიების დასახელება	მუშათა რიცხოვ ნობა	მუშათა საშუალოდღეღამური რიცხოვნობა თვეები		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
1	მეზონტაჟე (ფილის სადემონტაჟო სამუშაო)	12			
2	კალატოზი(აგურის კედლების დემონტაჟი)	18			
3	ელემენტდუღებელი (არმატურის კარვების ჩაკრა)	3			
4	აგურის მემანქანე	2			
5	აგურის მემანქანის თანამშემუ	2			
6	ელექტრიკოსი (ელ.ქსელის დემონტაჟი)	2	40	60	50
7	სანტექნიკოსი (წყალ-კანალ. დემონტაჟი)	2			
8	დამხმარე მუშა	20			
9	ხური (სახურავის დემონტაჟი)	6			
10	მძლილი ავტოტრანსპორტის	14			
11	ექსკავატორის მემანქანე	2			
12	ბუღალტერიის მემანქანე	1			

პასუხისმგებელი შემსრულებელი  მჭავარიძე
